

路線計画図

駅舎イメージ図



松生町駅

PC軌道桁建設工事
大阪モレール(株)委託
(オリエタル白石・富士ビ・エス・
ピー・エス三菱・川田建設JV)
R3.6.10 ~ R10.2.29



門真南駅

門真南駅(仮称) 駅舎建設工事



鴻池新田駅

鴻池新田駅(仮称) 駅舎建設工事
鉄建・岩田地崎共同企業体
R6.3.25 ~ R10.2.29




荒本駅



瓜生堂駅

工事発注状況

R6.4.1現在

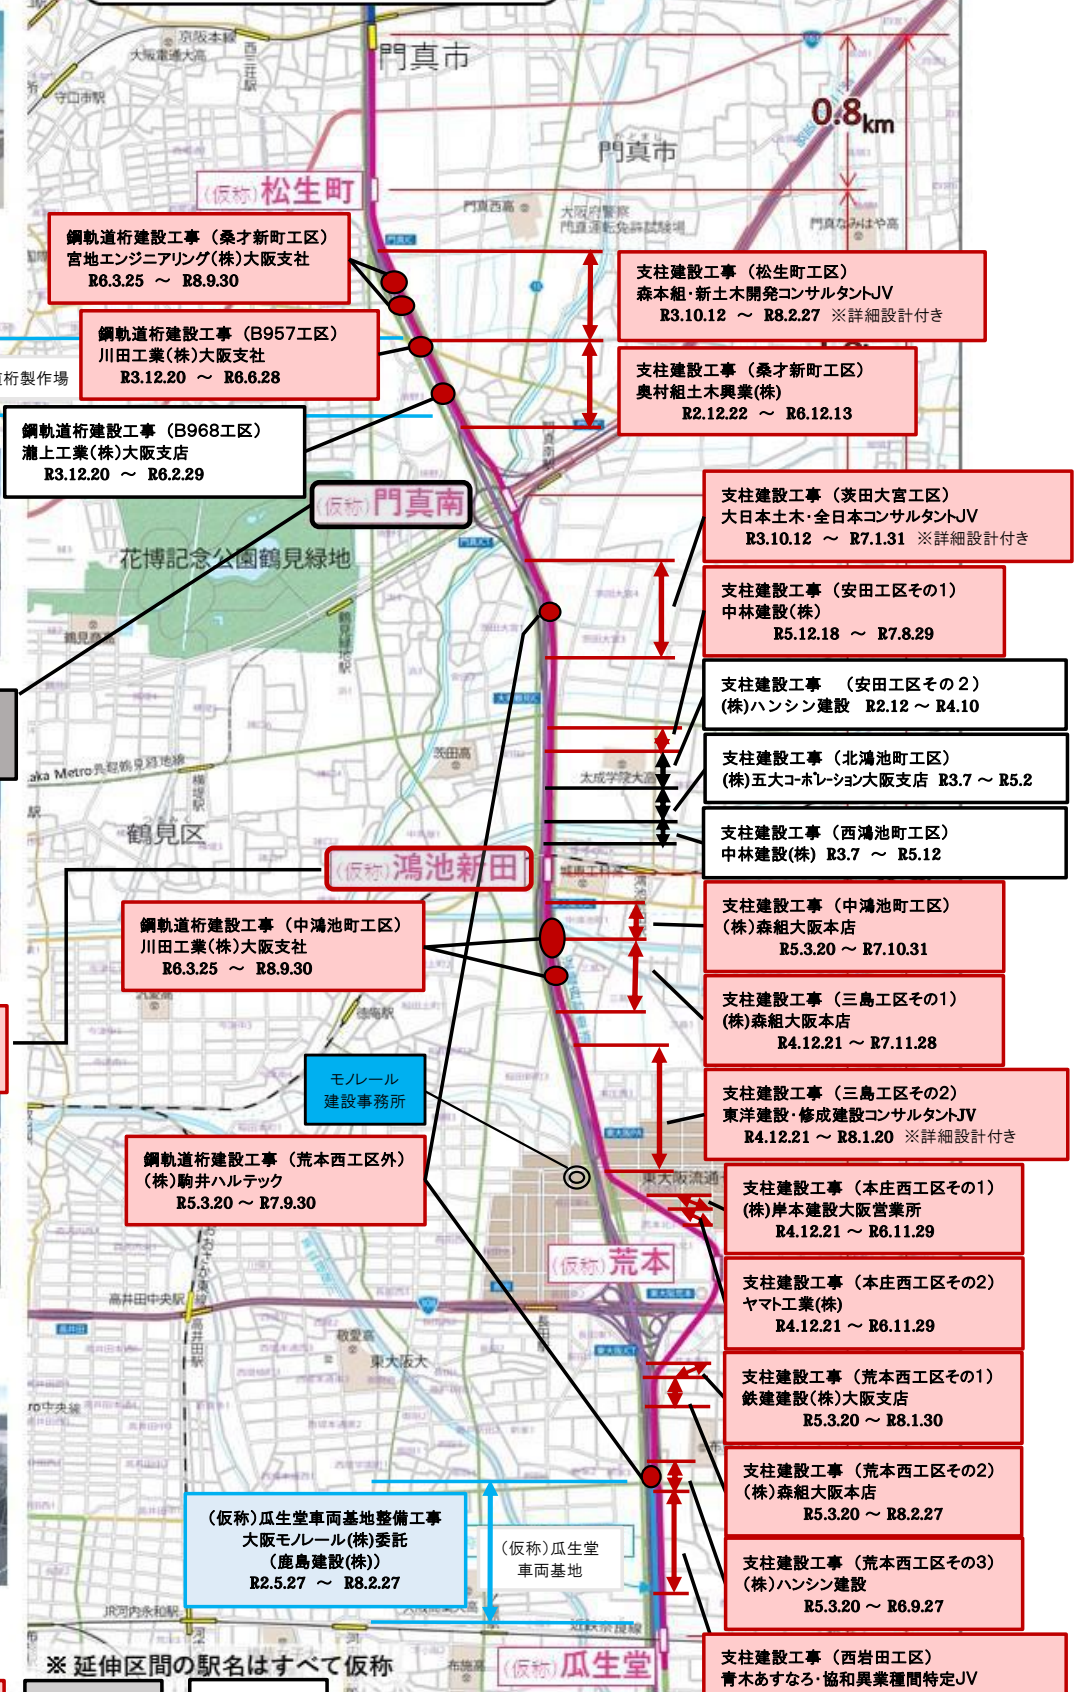

※ 延伸区間の駅名はすべて仮称

- 工事委託
- 工事・設計中
- 契約手続中
- 完了

路線計画図

詳細設計発注状況

R6.4.1現在

- 完了**
- ② 八千代エンジニアリング㈱
R2.9.9 ~ R5.2.28
 - ③ ㈱一ニチコンサルタント
R1.6.5 ~ R2.11.30
 - ⑤ パシフィックコンサルタンツ㈱
R3.3.12 ~ R5.3.15
 - ⑥ ㈱イト日本技術開発
R3.6.14 ~ R6.2.28
 - ④ ㈱復建技術コンサルタント
R2.9.17 ~ R6.2.28
 - ⑧ 復建調査設計㈱
R1.11.6 ~ R3.2.26
 - ⑨ 中央復建コンサルタント㈱
R3.3.22 ~ R5.3.15
 - ⑩ 中央復建コンサルタント㈱
R2.9.15 ~ R4.8.16
 - ⑪ セントラルコンサルタント㈱
R2.9.14 ~ R4.2.28
 - ⑫ ㈱一ニチコンサルタント
R3.6.11 ~ R5.2.28
 - ⑬ 復建調査設計㈱
R3.6.8 ~ R5.2.28
 - ⑭ ㈱一ニチコンサルタント
R1.11.12 ~ R4.2.28
 - ⑮ ㈱イト日本技術開発
R2.9.23 ~ R5.2.28
 - ⑯ セントラルコンサルタント㈱
R2.9.14 ~ R4.2.28
 - ⑰ ㈱復建技術コンサルタント
R2.7.27 ~ R5.2.28
 - ⑱ 協和設計㈱
R2.7.28 ~ R5.2.28
 - ⑲ セントラルコンサルタント㈱
R3.6.11 ~ R5.2.28
 - ⑳ 復建調査設計㈱
R2.7.29 ~ R4.2.28
 - ㉑ パシフィックコンサルタンツ㈱
R2.7.27 ~ R4.2.28
 - ㉒ ㈱復建技術コンサルタント
R3.6.7 ~ R5.2.28
 - ㉓ 中央復建コンサルタント㈱
R3.8.6 ~ R5.2.28

- 設計中**
- ① ㈱一ニチコンサルタント
R2.8.4 ~ R6.9.30
 - ⑦ ㈱復建技術コンサルタント
R3.6.7 ~ R6.7.31
 - ⑮ ㈱建設技術研究所
R3.3.22 ~ R6.7.1
 - ⑳ ジェール西日本コンサル㈱
R4.6.24 ~ R6.7.1
 - ㉔ 中央復建コンサルタント㈱
R4.6.17 ~ R6.7.1
 - ㉕ ㈱復建技術コンサルタント
R4.6.27 ~ R6.7.1
 - ㉖ パシフィックコンサルタンツ㈱
R4.10.12 ~ R6.7.1
 - ㉗ 八千代エンジニアリング㈱
R4.10.20 ~ R6.7.1

完了 設計中 OMC委託中

